

SEGUIMOS

Avanzamos con enlucidos de yeso!

MAYO
JUNIO
2023

Etapa de OBRA

30 % Terminaciones


PLAZA,
BELTRÁN

 TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS

DETALLES GENERALES

En este último mes, mientras avanzamos con los yesos proyectados, nos dedicamos a realizar tareas sobre las fachadas del edificio.

Realizamos texturados en la terraza del edificio, levantamos barandas donde era necesario y también construimos el sector de la churrasquera.

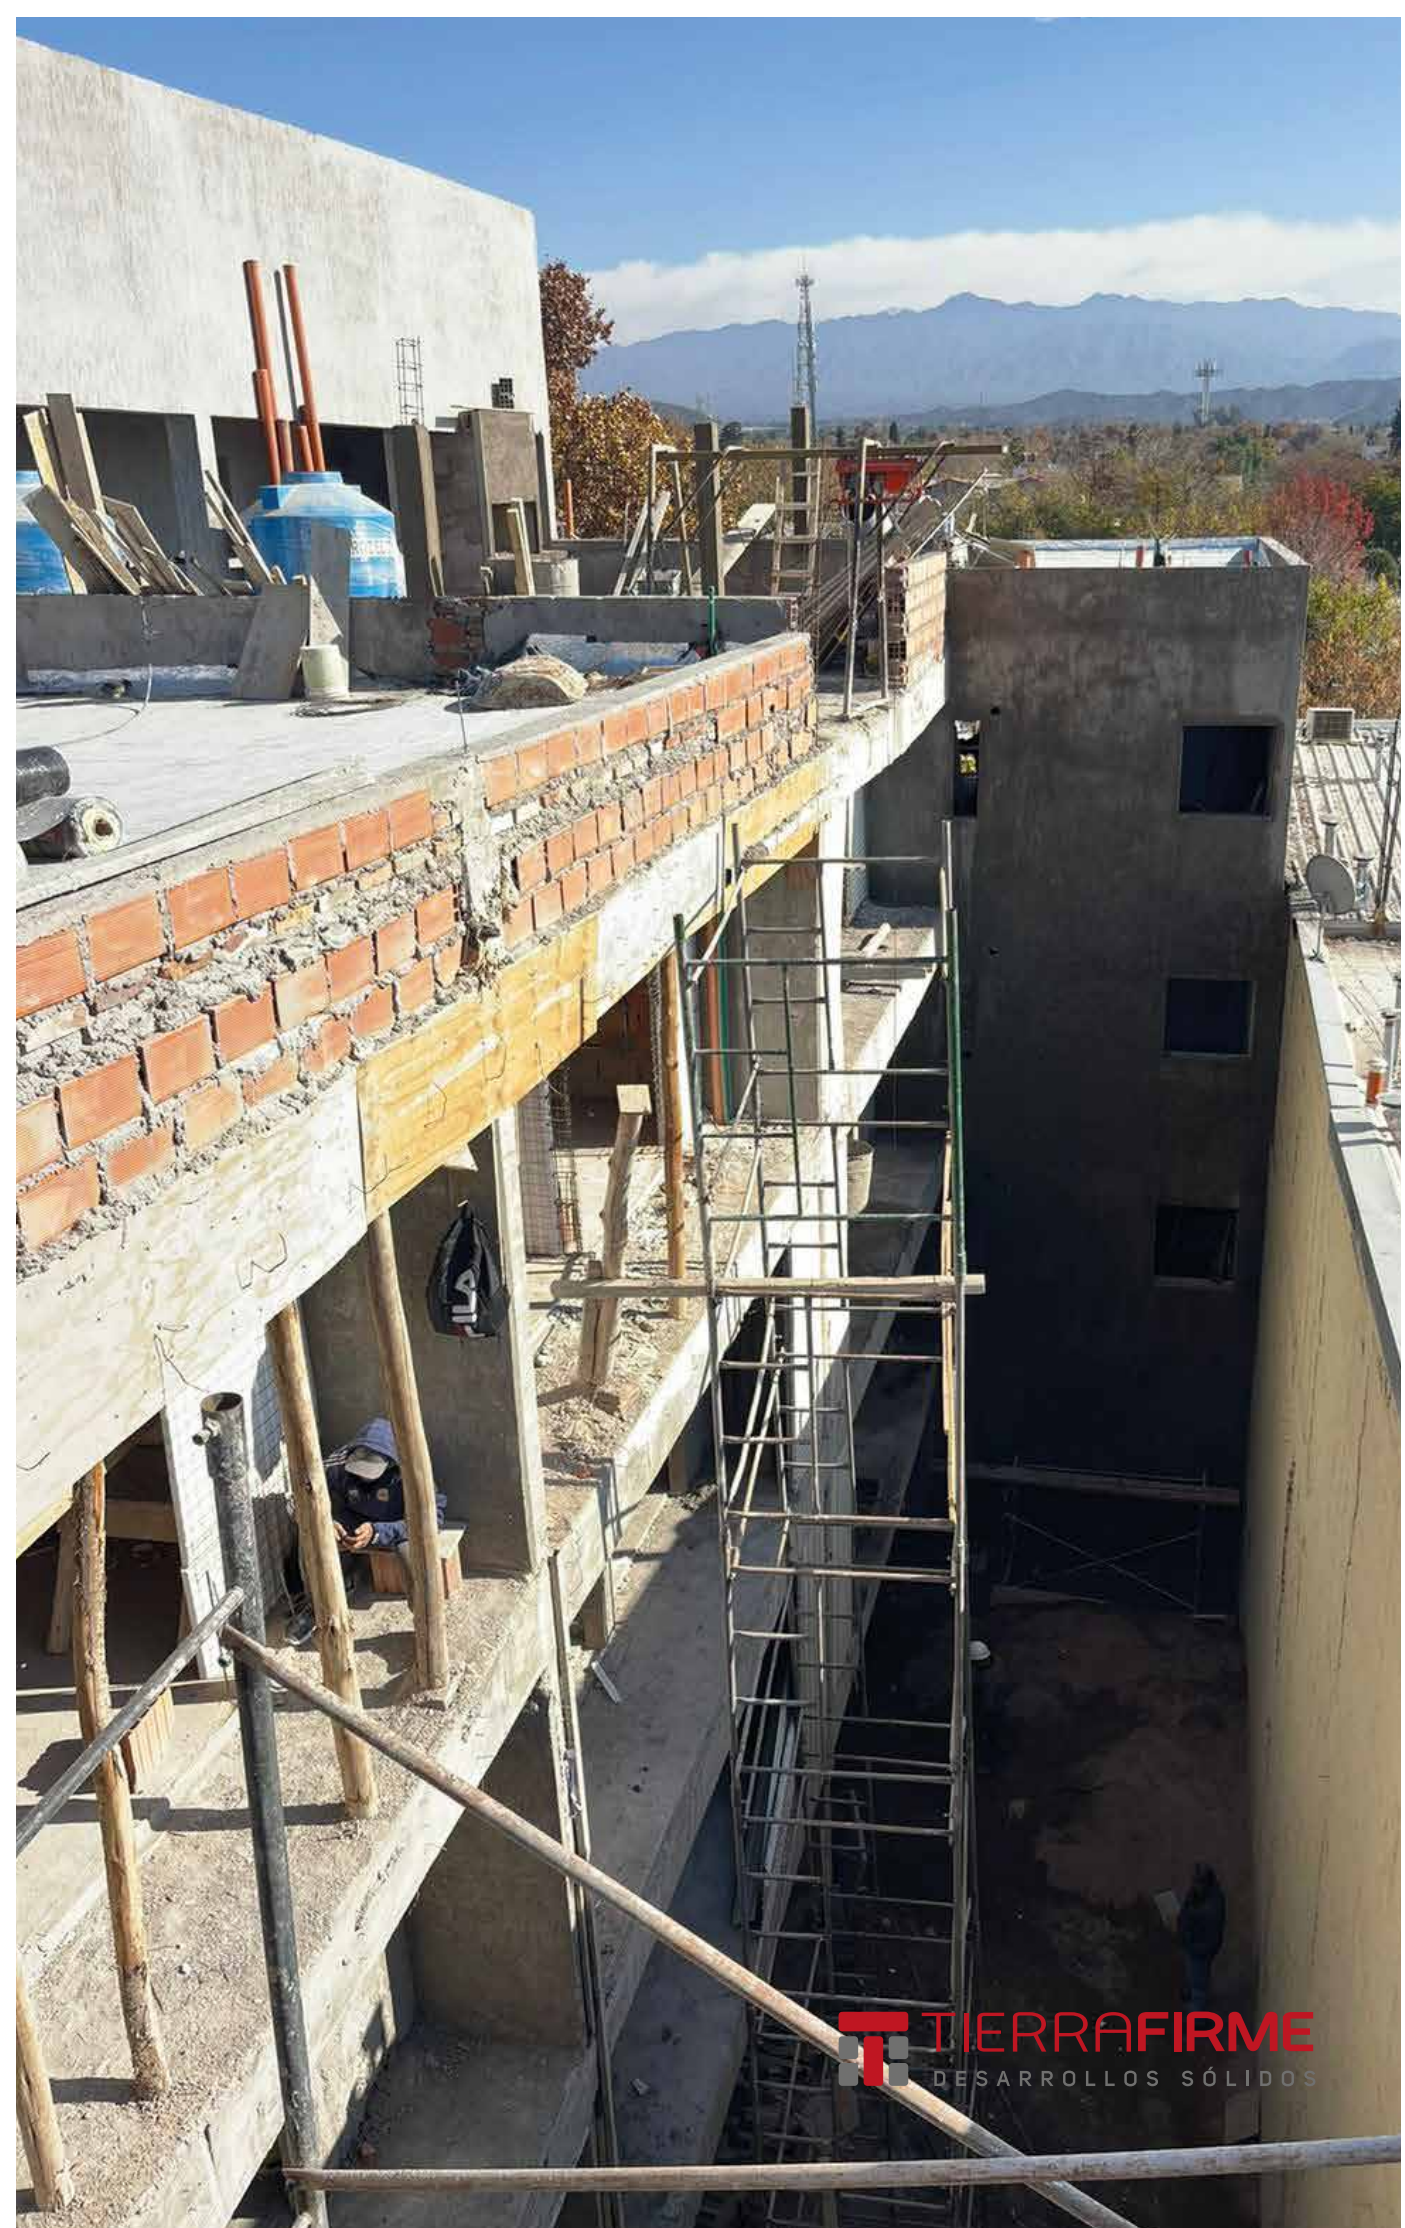

Además avanzamos de lleno en los enlucidos de yeso de 2do Piso ya que finalizamos todos los departamentos del 1er Piso.


Antes de eso nos sometimos a una serie de inspecciones municipales de instalaciones las cuales fueron aprobadas con éxito.



Es importante saber que ya empezamos a fabricar las barandas metálicas de todo el edificio.

Las mismas se están fabricando por módulos y en breve empezaremos a colocarlas.

Estas barandas van a proteger todos los tramos de escaleras y balcones.

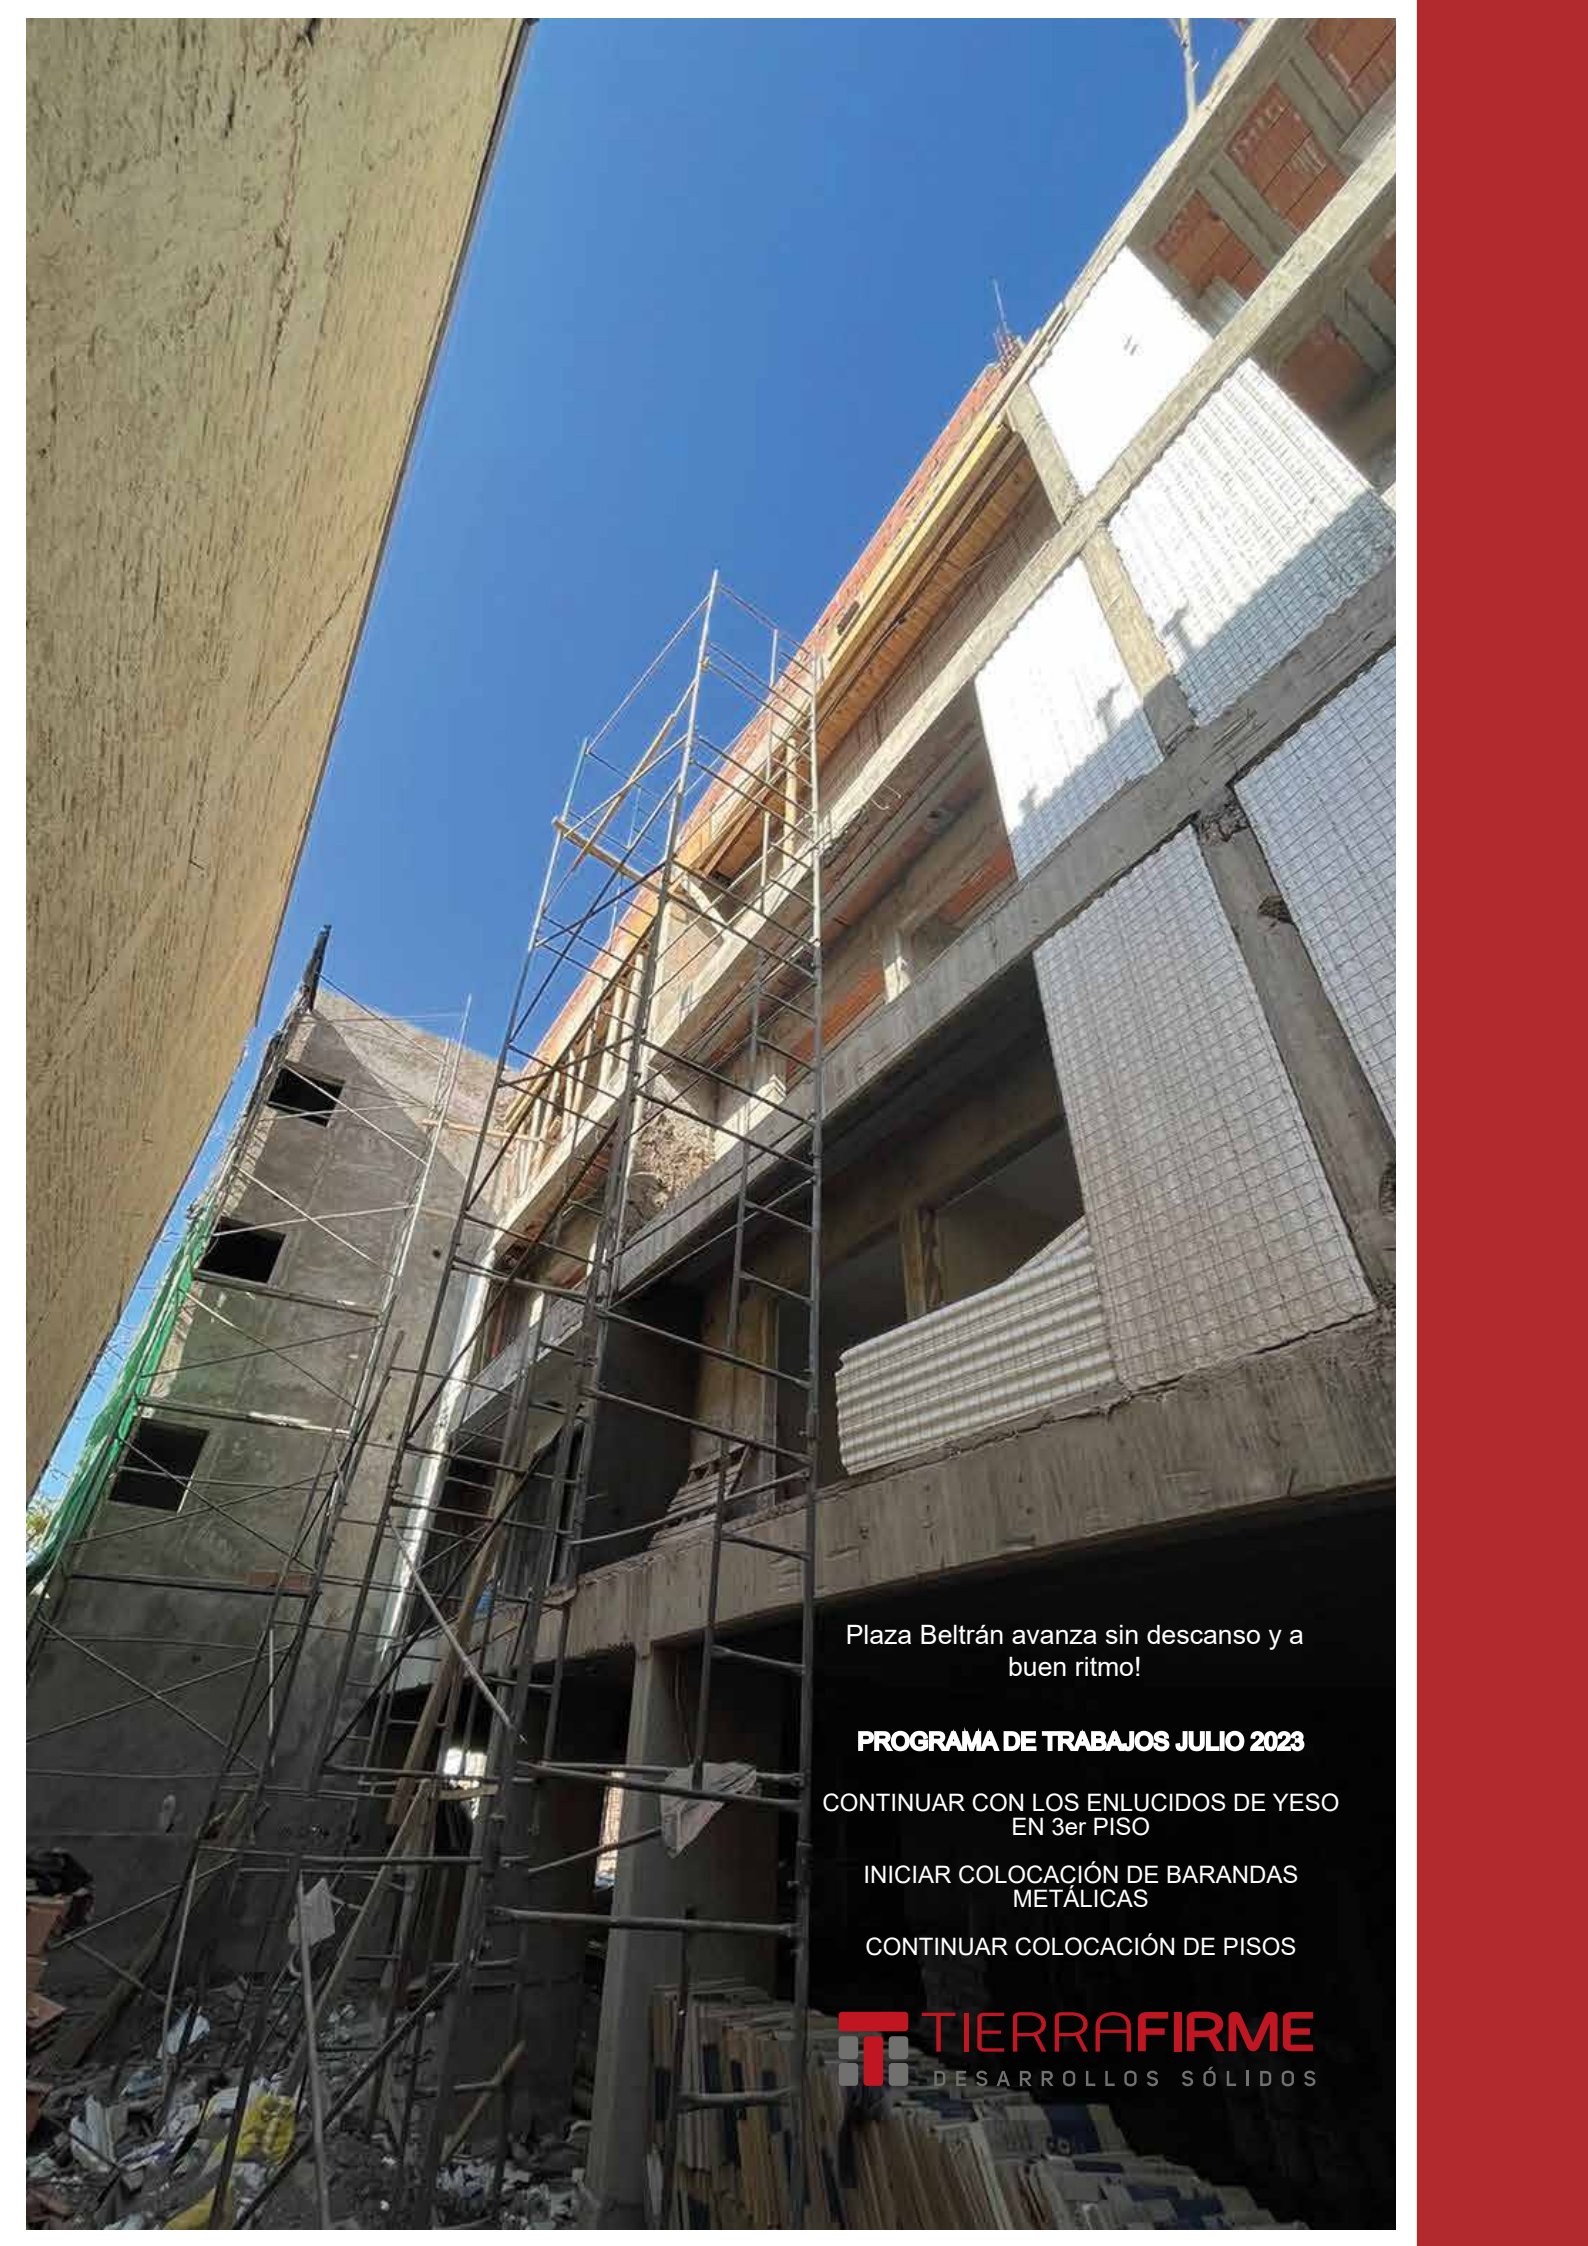

Plaza Beltrán avanza sin descanso y a buen ritmo!

PROGRAMA DE TRABAJOS JULIO 2023

CONTINUAR CON LOS ENLUCIDOS DE YESO
EN 3er PISO

INICIAR COLOCACIÓN DE BARANDAS
METÁLICAS

CONTINUAR COLOCACIÓN DE PISOS

 **TIERRAFIRME**
DESARROLLOS SÓLIDOS
