



## PARQUE AGUSTÍN

QUINTA SECCIÓN

### Etapa de OBRA

100% TABIQUES 2° PISO

100% LOSA MACIZA 3°

100% ESCALERA DEL 2° AL 3°


33% Armado de tabiques 3° PISO

# LOSA 3° PISO FINALIZADA

Durante el último mes, hemos avanzado a paso firme en la obra, trabajando de manera coordinada con el equipo de constructores, electricistas y plomeros. El objetivo ha sido cumplir con el cronograma establecido, logrando completar la losa del tercer piso. Para el mes de octubre, se prevé iniciar con la ejecución de los tabiques del tercer nivel y avanzar con la losa del cuarto piso.

A continuación, se presentan imágenes del trazado eléctrico, la ubicación de los pases para el sistema cloacal y el armado de la estructura correspondiente al proyecto.



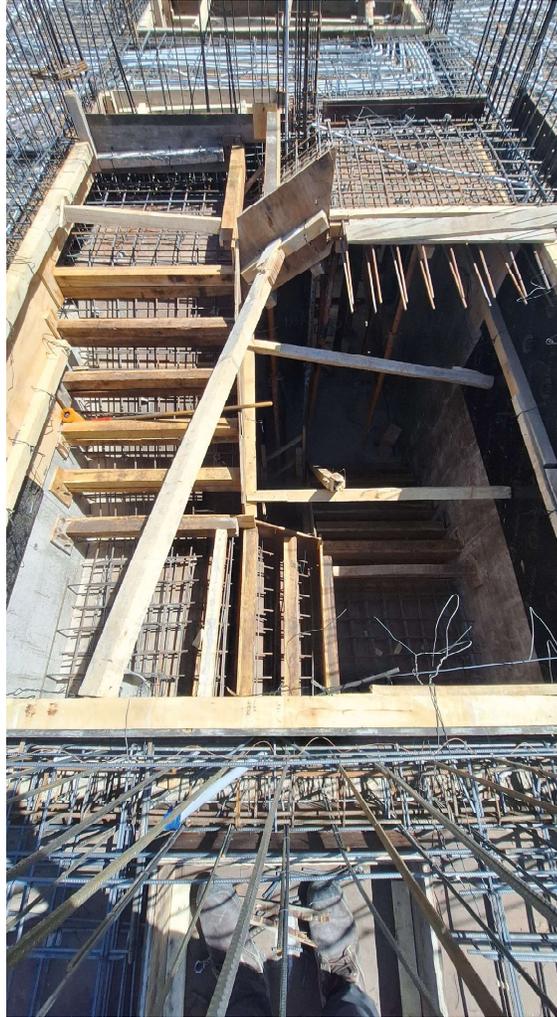



La losa ha sido cubierta con nylon para asegurar una adecuada humedad durante su proceso de fraguado, garantizando así una correcta consolidación del hormigón.

A comienzos del mes de octubre, recibimos la visita del intendente Ulpiano Suárez en la obra, quien mostró su interés por el proyecto de gran envergadura que tendrá un impacto significativo en la ciudad de Mendoza. Durante su recorrido, el intendente destacó el notable progreso que se ha logrado desde el inicio de los trabajos.

