

AL PRIMER PISO

Hormigonamos
primeras losas!

las



LINIERS

PLAZA

**AVANCE
DE OBRA**

| septiembre 2024



Entre Septiembre y Octubre logramos llenar la totalidad de las losas correspondientes al Primer Piso, incluyendo vigas y balcones. Conjuntamente hemos llenado el primer tramo de escalera (Planta Baja - Primer Piso).


LINIERS
PLAZA


TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS



Previo al hormigonado, dedicamos varios días al armado de hierros de vigas, losas macizas y arranques de columnas del primer piso. Luego se izaron viguetas de losas alivianadas y colocamos elementos cerámicos, mientras que, en simultáneo, encoframos los elementos estructurales y apuntalamos.



LINIERS
PLAZA



TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS



Antes de hormigonar las losas del 1er. nivel, iniciamos trabajos en la instalación eléctrica. De esta manera, se empezaron trabajos de colocación de cañerías y cajas en losas del primer piso. En simultáneo, se realizaron trabajos de instalación sanitaria, dejando colocadas previamente en las losas algunas piezas de desagües pluviales.



LINIERS
PLAZA



TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS



Ahora, esperaremos el tiempo indicado por las Normas para el fraguado del hormigón y procederemos al desencofrado y desapuntalado de la estructura!


LINIERS
PLAZA

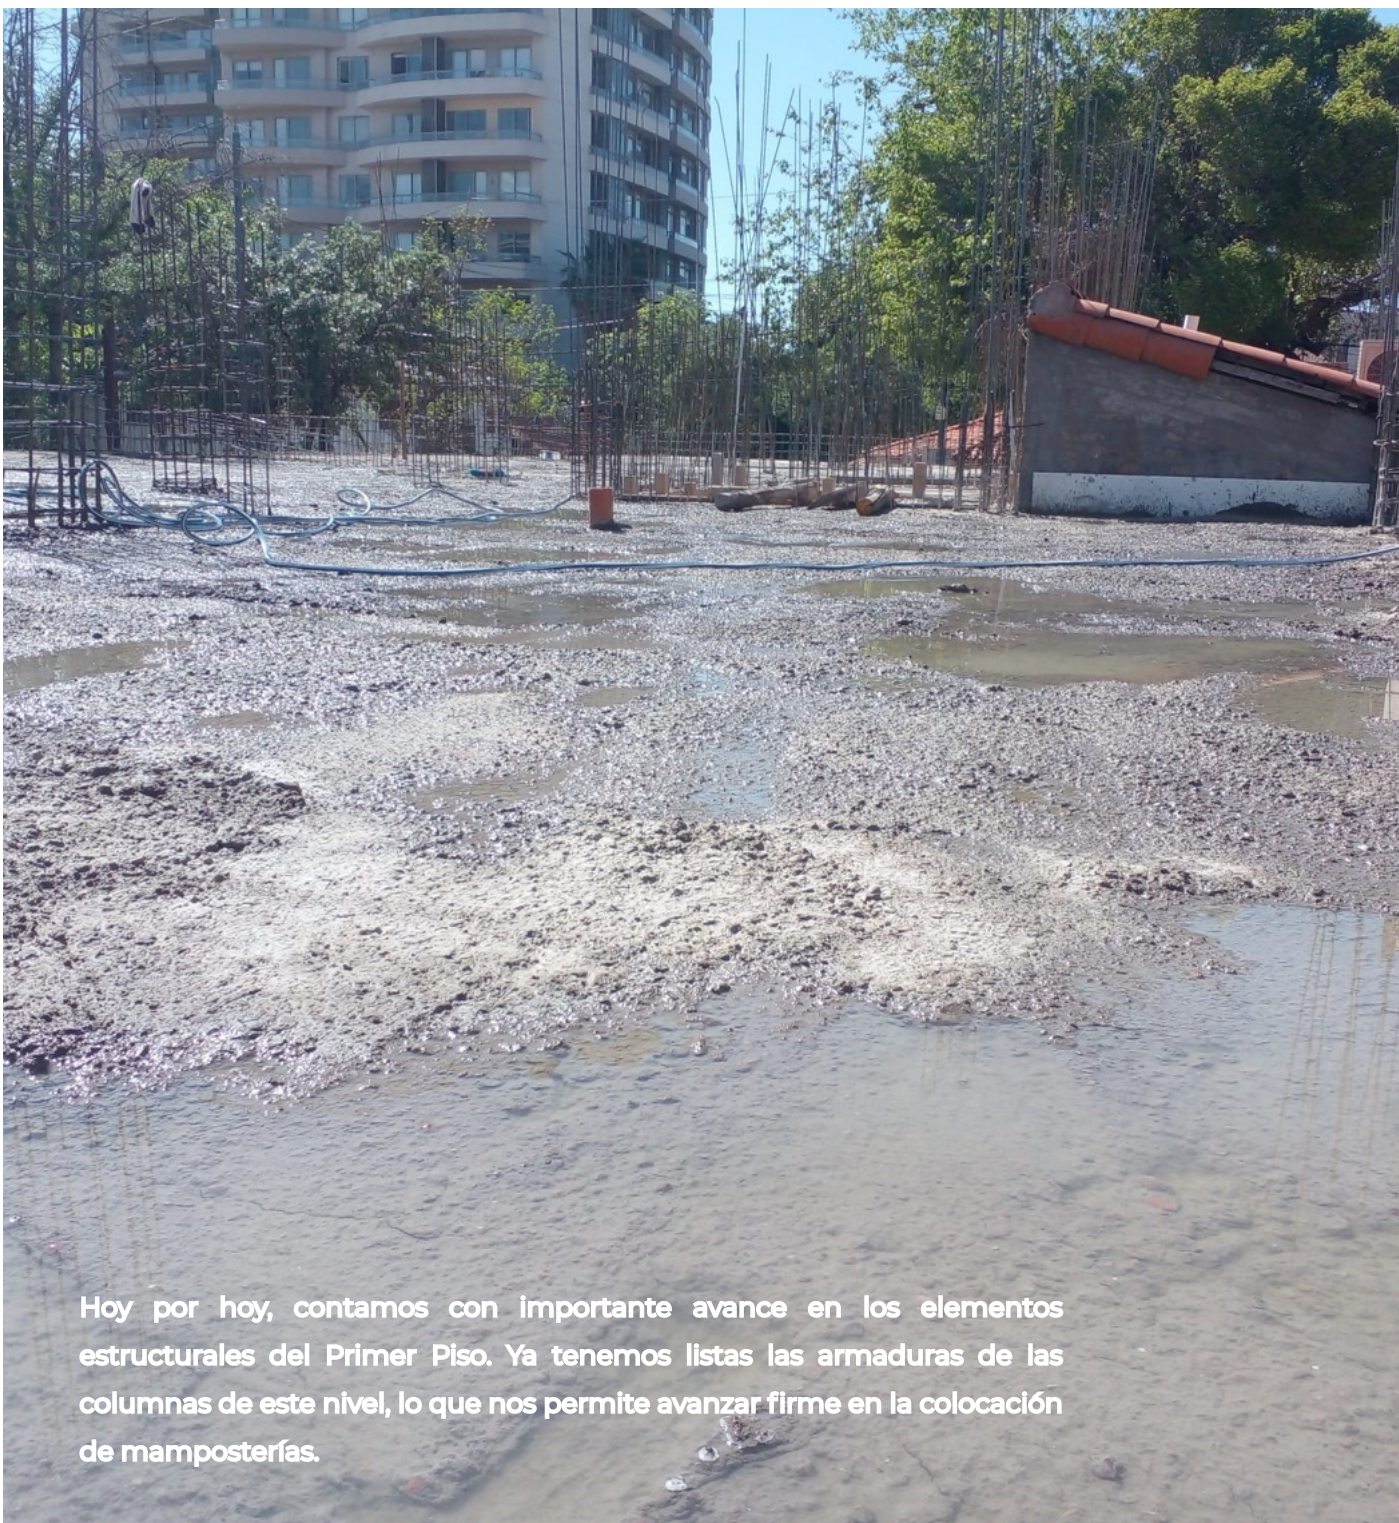

TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS



LINIERS
PLAZA



TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS



Hoy por hoy, contamos con importante avance en los elementos estructurales del Primer Piso. Ya tenemos listas las armaduras de las columnas de este nivel, lo que nos permite avanzar firme en la colocación de mamposterías.

PROGRAMA DE TRABAJOS PARA OCTUBRE 2024

- DESENCOFRAR Y DESAPUNTALAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE PB.**
- LEVANTAR MUROS DE PRIMER PISO**
- HORMIGONAR TABIQUES Y COLUMNAS DE PRIMER PISO**
- INICIAR EL ARMADO DE LAS VIGAS DE LAS LOSAS DE SEGUNDO PISO**

