



LOSA 5°PISO!!

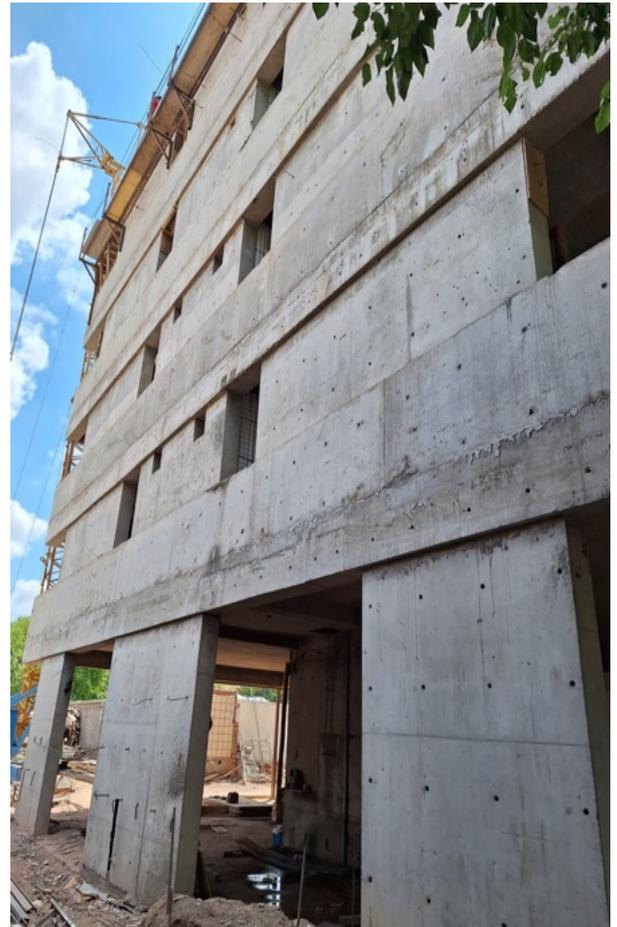

PARQUE AGUSTÍN

QUINTA SECCIÓN

Etapa de OBRA

100% LOSA 5° PISO

100% BOCAS ELECTRICAS EN LOSA

50% DIVISIONES INTERNAS DE 3 PISO

33% Armado de tabiques 5°PISO



TIERRAFIRME

DESARROLLOS SÓLIDOS

LOSA Y ESCALERA 4° PISO TERMINADA

Durante el año 2024, hemos logrado importantes avances en la obra. Iniciamos el año trabajando en el subsuelo del proyecto y lo concluimos con la construcción del 5° piso, quedando pendientes tres pisos para completar la estructura. Nos mantenemos en línea con el cronograma planteado, lo que reafirma nuestro compromiso con el cumplimiento de los plazos establecidos.

Detalles del avance:

En diciembre de 2024, se finalizó la losa del 5° piso, incluyendo la instalación de cañerías eléctricas y los arranques de los tabiques correspondientes al 5° piso.

Paralelamente, se avanzó en las divisiones internas de departamentos en los pisos 1°, 2° y 3°.

Está previsto que, a mediados de enero de 2025, se inicien los trabajos de instalación de las cañerías eléctricas y sanitarias en los pisos superiores.

Este 2025 continuaremos con el mismo ritmo de trabajo, avanzando de manera sostenida para cumplir con las metas propuestas y garantizar la calidad del proyecto.



DIVISION DE DEPTOS 1, 2 Y 3 PISO



DIVISIONES INTERNAS DE EPS EN 1°, 2° Y 3° PISO
