

CONTINUAMOS A PASO FIRME ! AGOSTO

TABIQUES DEL 3° PISO!!



EDIFICIO
PARQUE
de los
ANDES

Etapa de OBRA


100%	Tabiques 2° piso
100%	Losa 2 ° piso
650%	Instalacion electrica en 1° piso
65%	Armado de tabiques 3°PISO

 **TIERRAFIRME**
DESARROLLOS SÓLIDOS


INSTALACION ELECTRICAS



INSTALACION PUENTE METALICO

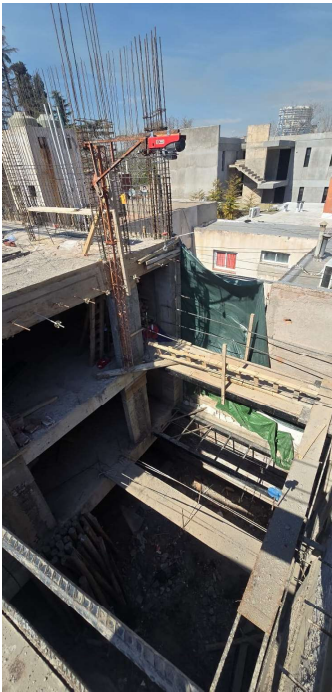

TABIQUES DEL 3° PISO

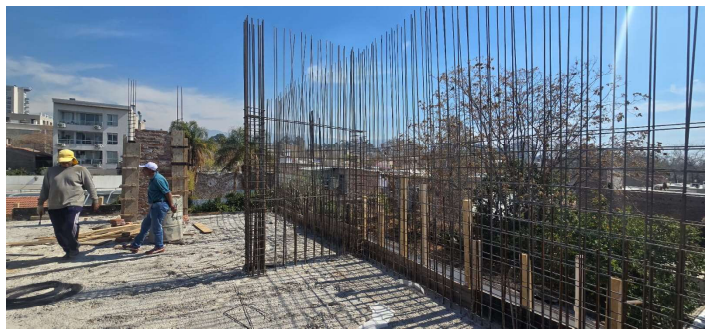

EDIFICIO
PARQUE
de los
ANDES

INFORME DE OBRA

Obra: Parque Los Andes
Fecha: Septiembre 2025

Avance de obra

Durante el presente período se han ejecutado las siguientes tareas principales:

Estructura:

Hormigonado y terminación de la losa del 2° piso.

Ejecución de la escalera que vincula del 1° al 2° piso.

Montaje de los puentes metálicos de conexión en el primer bloque del segundo nivel (1° y 2° piso).

Avance en la ejecución de los tabiques del 3° piso, próximos a finalizar para dar inicio a la armadura de vigas y posterior hormigonado de la losa del último piso.

Instalaciones:

El gremio de electricistas continúa trabajando en 1° y 2° piso, con el tendido de cañerías embutidas.

Albañilería y terminaciones:

Ejecución de muros y revoques en el patio principal e interiores de los primeros niveles.

Estado de situación

La obra se desarrolla de acuerdo al cronograma establecido, cumpliendo con los plazos previstos y manteniendo un ritmo sostenido de avance.

Próximas tareas:

Finalización de tabiques del 3° piso.

Inicio de vigas y losa del último piso.

Continuidad de instalaciones eléctricas en 1° y 2° piso.

Avance en revoques y cerramientos en sectores comunes e internos.

