

SEGUIMOS AVANZAMOS!

AVANZAMOS FIRMES EN EL ÚLTIMO
PISO DEL EDIFICIO.




LINIERS
PLAZA

AVANCE
DE OBRA

| abril y mayo

TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS

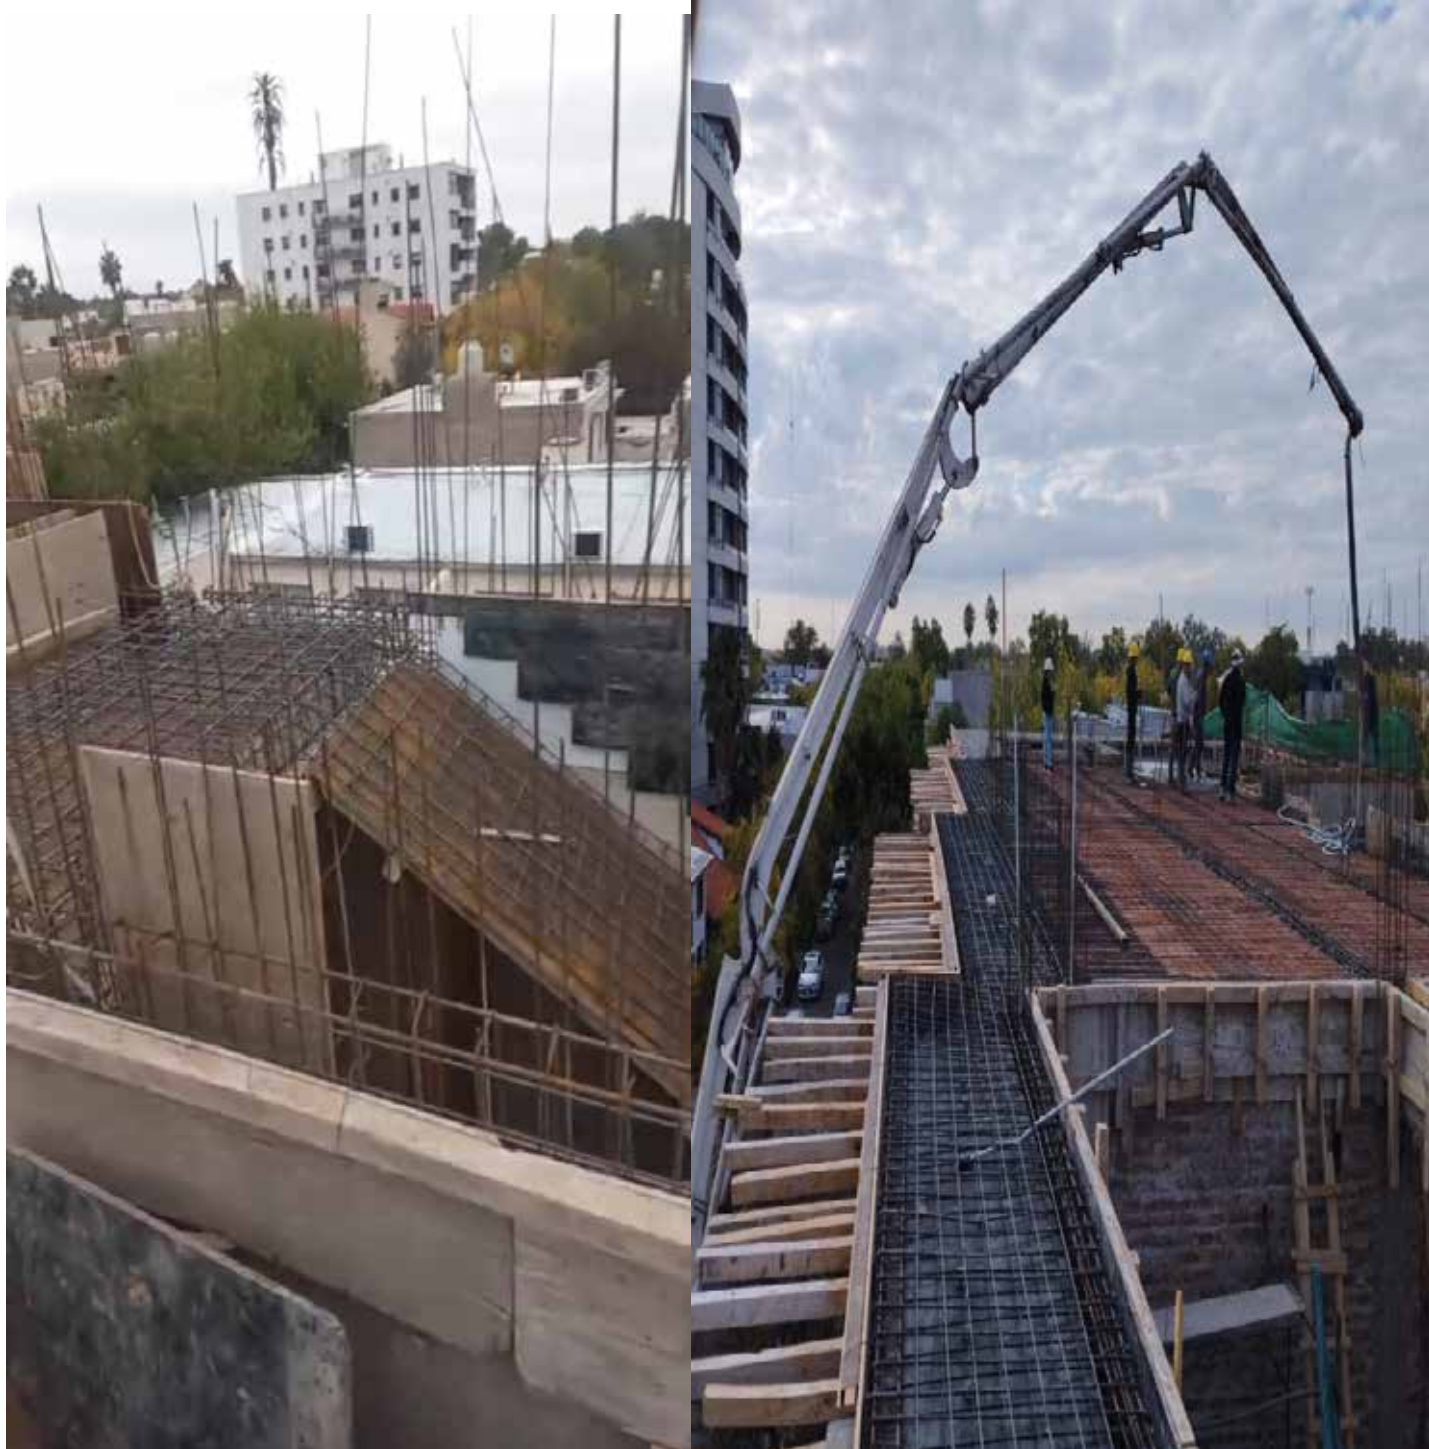

"Durante este mes se llevó a cabo la ejecución del armado de vigas, losa, tramo de escalera y aleros correspondientes al último nivel cumpliendo con los requerimientos estructurales, alcanzando con ello los objetivos constructivos establecidos para esta fase del proyecto."


LINIERS
 PLAZA


TIERRAFIRME
 DESARROLLOS SÓLIDOS



Encofrado, Instalaciones y Hormigonado de Estructuras.

Durante el mes de marzo y abril se finalizaron los trabajos de encofrado de escaleras y vigas, así como el armado de cañerías correspondientes a las instalaciones eléctricas y sanitarias, todas sometidas y aprobadas mediante las inspecciones pertinentes (eléctrica, sanitaria y estructural), concluyendo con el llenado de losa, vigas, escalera y aleros, dando por concluida satisfactoriamente esta etapa de la obra.


LINIERS
PLAZA


TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS



Colocación de Paneles Interiores y Avance en Instalaciones.

Paralelamente, se avanzó con la colocación de muros interiores, destinados a conformar estos meses las divisiones internas tanto del primer como del segundo piso. Asimismo, se llevaron a cabo las instalaciones internas correspondientes a los sistemas de gas, agua, desagües cloacales y electricidad, dejando preparado el avance necesario para las próximas etapas.


LINIERS
PLAZA


TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS



Montaje de la Cubierta

Finalizado el llenado de losa, vigas, escalera y aleros, se dio inicio a los trabajos correspondientes a la cubierta liviana. Para garantizar la seguridad, optimizar los tiempos de ejecución y cumplir con los objetivos establecidos en el cronograma de obra, se contrató una grúa destinada al izado de rollizos y machimbre. Las tareas comenzaron durante el mes de mayo, proyectando la finalización de esta etapa para fines del mismo mes.


LINIERS
PLAZA


TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS



De acuerdo con el cronograma establecido, durante el mes de mayo continuará trabajando con intensidad en la finalización de las cubiertas

PROGRAMA DE TRABAJOS PARA EL MES DE JUNIO 2025

inicio del armado y luego ejecución de la losa correspondiente a los tanques y a la cubierta del ascensor. Paralelamente, iniciar en los muros interiores del tercer piso y trabajos de revoque, tanto en interiores como en exteriores.

También se prosigue con la ejecución de instalaciones y la gestión de los pedidos de inspección correspondientes. Estas acciones permitirán mantener el ritmo de obra previsto y asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados para la siguiente etapa.
