

GRAN AVANCE EN SUS 4 FACHADAS



EDIFICIO
PARQUE
— de los —
ANDES

Etapas de OBRA

100%

CUBIERTA 4 PISO

100%

TABIQUE 5° TANQUE DE RESERVA

50%

PANELES EN DEPTOS

50%

INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICA



TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS

FACHADAS

Terminaciones exteriores




Revoque fachadas internas

Instalacion sanitaria



Recuadros barandas balcón

Instalacion sanitaria

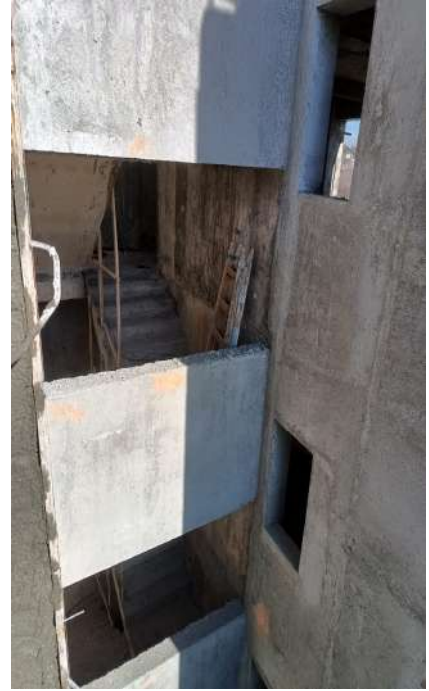

Cubierta 4° piso

EDIFICIO
PARQUE
de los
ANDES

Informe de Avance de Obra – Parque Los Andes

Durante el período informado, la obra mantuvo un ritmo sostenido de ejecución, concentrando los esfuerzos en tareas correspondientes a la envolvente exterior y en el avance de las instalaciones de los sectores de servicios.

Se trabajó intensamente en la ejecución de los revoques exteriores de las cuatro fachadas del edificio, realizando las intervenciones necesarias incluso desde propiedades linderas, en coordinación con los vecinos, lo que permitió dar continuidad a los trabajos de terminación de la envolvente y mejorar significativamente el grado de avance de la imagen exterior del proyecto.

En forma paralela, se avanzó en los depósitos internos, ejecutando las instalaciones sanitarias y eléctricas, dejando estos espacios preparados para las etapas posteriores de terminación.

En el sector de cubierta, se completaron los trabajos correspondientes al área de los tanques de cisterna, finalizando las tareas previstas para este frente de obra y consolidando un importante hito dentro de la infraestructura general del edificio.

Trabajos a continuar

Durante el próximo período se prevé continuar con:

Ejecución y terminación de los revoques exteriores en las distintas fachadas hasta su completa finalización. Avance en la materialización de las divisiones interiores de los departamentos correspondientes al 3.º y 4.º piso, permitiendo consolidar la distribución definitiva de las unidades y dar continuidad a las instalaciones y terminaciones posteriores.

En términos generales, la obra mantiene una evolución acorde a la planificación establecida, consolidando avances significativos tanto en la envolvente del edificio como en la infraestructura de los sectores técnicos, permitiendo preparar los próximos frentes de trabajo para las etapas de mampostería interior y terminaciones.
