


GRAN AVANCE DE TEXTURADO EN SU FACHADA PRINCIPAL Y COLOCACIÓN DE PANELES

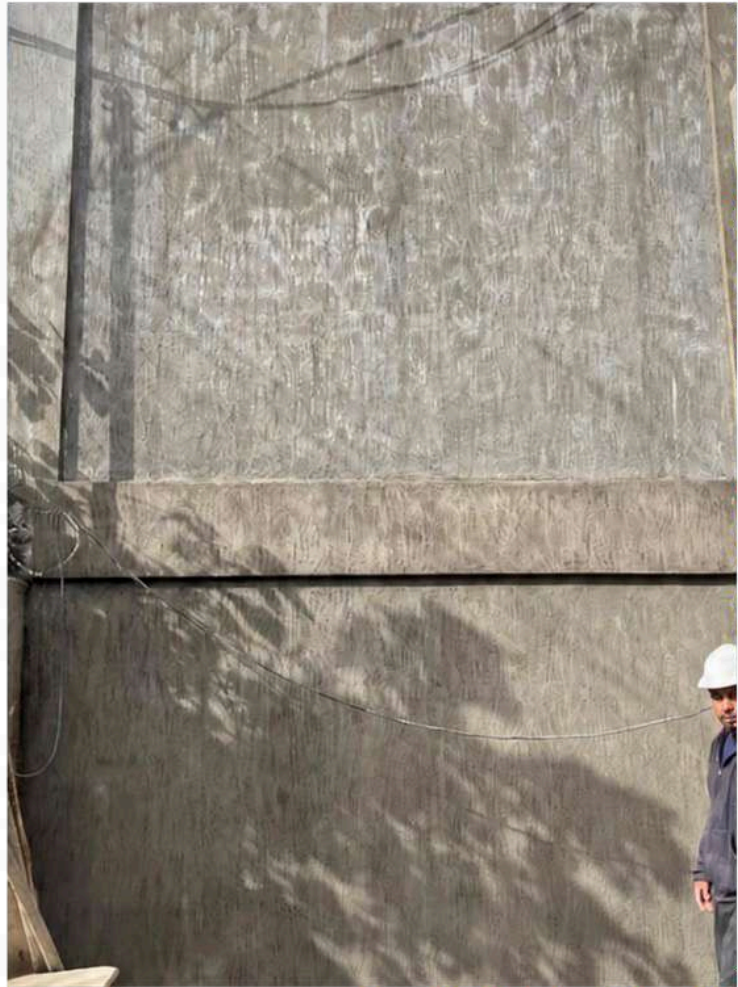

EDIFICIO **PARQUE** — de los — **ANDES**

Etapa de OBRA

100%	CUBIERTA 4 PISO
100%	TABIQUE 5° TANQUE DE RESERVA
90%	PANELES EN DEPTOS
60%	INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICA

INTERIORES


Terminaciones interiores de primer piso



Revoque muros internos
Instalación sanitaria



Colocación de paneles en el 4º piso
Instalación sanitaria

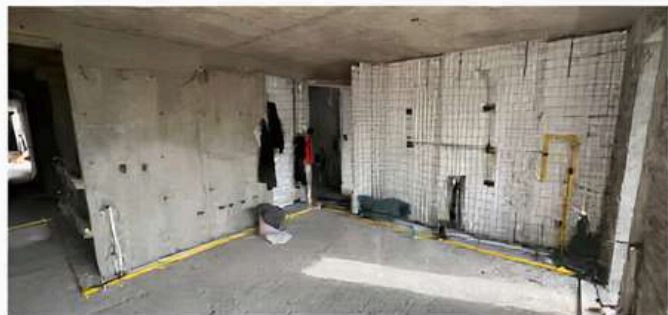

Colocación 4º piso

EDIFICIO
PARQUE
de los
ANDES

Informe de Avance de Obra – Parque Los Andes

Durante el período informado, la obra avanzó en los trabajos de terminación interior, las instalaciones de los departamentos, la ejecución de divisiones interiores y las terminaciones exteriores del edificio.

En el primer piso, correspondiente al bloque oeste, se encuentran en etapa de finalización los revoques interiores de los departamentos. En paralelo, se avanzó con las instalaciones sanitarias y de gas, mientras que las instalaciones eléctricas continúan en proceso.

En el cuarto piso, se completó la colocación de los paneles de poliestireno expandido (EPS) destinados a la ejecución de los muros divisorios.

En cuanto a la envolvente exterior, se avanzó con el texturado de la fachada, principalmente en los muros correspondientes a los balcones y en los laterales del edificio.

Trabajos a continuar

Durante el próximo período se prevé continuar con:

Durante el próximo período se prevé continuar con la ejecución de revoques en los departamentos restantes, completar los trabajos de revoque pendientes y dar inicio a las tareas de yesería. Asimismo, se prevé avanzar con la ejecución de contrapisos en los sectores correspondientes.

En términos generales, la obra continúa avanzando en los trabajos interiores y exteriores, preparando los distintos sectores para las siguientes etapas de terminación.
